




เอกสารตรวจรับงานติดตั้ง

การเข้าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๖
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

1. ข้อมูลหน่วยงาน/โรงเรียน

ชื่อหน่วยงาน/โรงเรียน			
ที่อยู่			
Latitude		Longitude	
ชื่อผู้ประสานงาน			ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน		เบอร์โทรศัพท์มือถือ	
หน่วยงาน/โรงเรียน (กาเครื่องหมาย ✓ หน้าขนาดโรงเรียน)			
	ขนาดโรงเรียน	Download/Upload	จำนวน IP Address
	นักเรียน 1-120 คน	200/100 Mbps.	1
	นักเรียน 121-300 คน	300/150 Mbps.	1
	นักเรียน 301-500 คน	400/200 Mbps.	1
	นักเรียน 501-1,000 คน	500/300 Mbps.	1
	นักเรียน 1,001-1,500 คน	2,000/500 Mbps.	4
	นักเรียน 1,501-2,000 คน	3,000/1,000 Mbps.	8
	นักเรียน 2,001 คนขึ้นไป	4,000/1,000 Mbps.	8
	โรงเรียนที่เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC)	1,000/500 Mbps.	1
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	300/300 Mbps.	8
	ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด	300/150 Mbps.	1

2. Network Diagram แสดงรูปแบบการเชื่อมต่อวงจรอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์

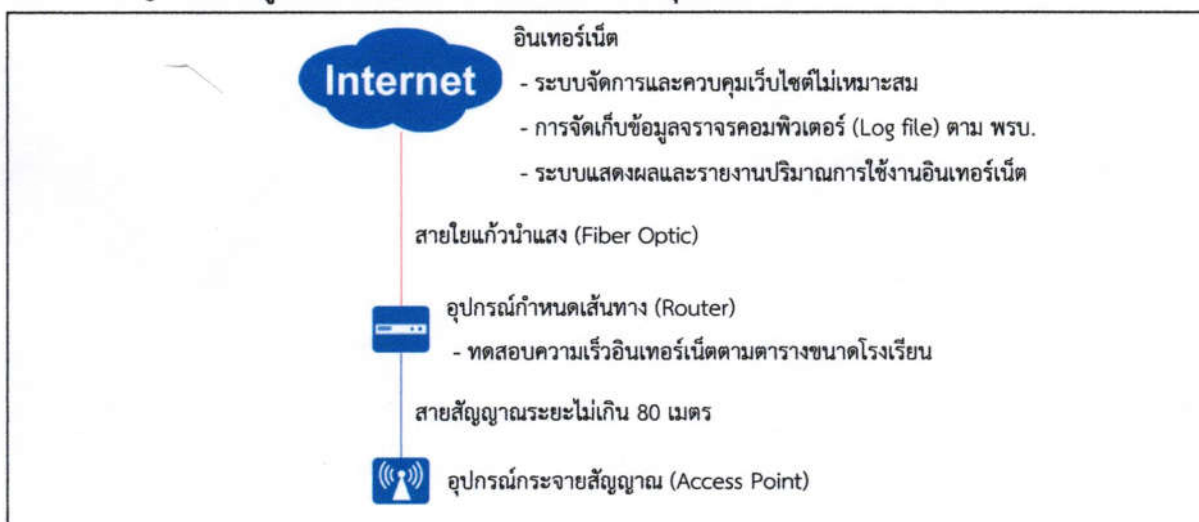



3. การติดตั้งวงจรรินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์

การติดตั้งวงจรรินเทอร์เน็ต			
วงจรรที่	Circuit ID	IP Address	การตรวจสอบ
1			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
2			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
3			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
4			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี

การติดตั้งอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)	
วงจรรที่	การตรวจสอบ
1	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
2	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
3	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
4	<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี

การเดินสายสัญญาณระยะไม่เกิน 80 เมตร		
ลำดับที่	ระยะสายสัญญาณ (เมตร)	การตรวจสอบ
1		<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
2		<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
3		<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
4		<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี

การติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)			
ตัวที่	ข้อมูลอุปกรณ์	จุดติดตั้ง (อาคาร/ชั้น/ห้อง)	การตรวจสอบ
1	S/N : MAC :		<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
2	S/N : MAC :		<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
3	S/N : MAC :		<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี
4	S/N : MAC :		<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี



4. การทดสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต Download/Upload ที่อุปกรณ์ Router

วงจรที่	Circuit ID	Download (Mbps.)	Upload (Mbps.)	ผลการทดสอบ
1				<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
2				<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
3				<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
4				<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

ทดสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point)

ตัวที่	ชื่อ SSID และ Password	กรณีเปลี่ยนชื่อ SSID และ Password (โปรดระบุ)	ผลการทดสอบ
1	ชื่อ SSID: True1-WiFi Password: truetrue	ชื่อ SSID: Password:	<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
2	ชื่อ SSID: True2-WiFi Password: truetrue	ชื่อ SSID: Password:	<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
3	ชื่อ SSID: True3-WiFi Password: truetrue	ชื่อ SSID: Password:	<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน
4	ชื่อ SSID: True4-WiFi Password: truetrue	ชื่อ SSID: Password:	<input type="checkbox"/> ผ่าน <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน

หมายเหตุ _____

5. การตรวจรับส่งมอบงาน

บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับหน่วยงาน/โรงเรียน เสร็จเรียบร้อยแล้ว และทดสอบการใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR ทุกประการ โดยเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ _____

หน่วยงาน/โรงเรียน	บริษัท โทร อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลายเซ็น _____	ลายเซ็น _____
ชื่อ-นามสกุล _____	ชื่อ-นามสกุล _____
ตำแหน่ง _____	ตำแหน่ง _____
เบอร์ติดต่อ _____	เบอร์ติดต่อ _____
(ประทับตราหน่วยงาน/โรงเรียน)	
